


Landkarte

Die projektspezifische Landkarte zeigt alle Projekteckpunkte und den aktuellen Stand des Projektes

Funktionen:

- Anzeige aller Projekteckpunkte in ihrer logischen Reihenfolge
- Zur besseren Lesbarkeit steht eine Zoomfunktion in die einzelnen Phasen zur Verfügung
- Durch das Anklicken eines Projekteckpunktes wird der Benutzer in eine detaillierte Beschreibung des Eckpunktes weitergeleitet
- Ein Klick auf den "PDF erzeugen" Button erstellt eine optimierte PDF Ansicht der Landkarte
- Anzeige des Projekt Soll-Status auf einer Zeitlinie durch eine rote Linie
- Bei Klick auf den "Präsentation erzeugen" button wird eine Powerpoint Ansicht der Landkarte erstellt

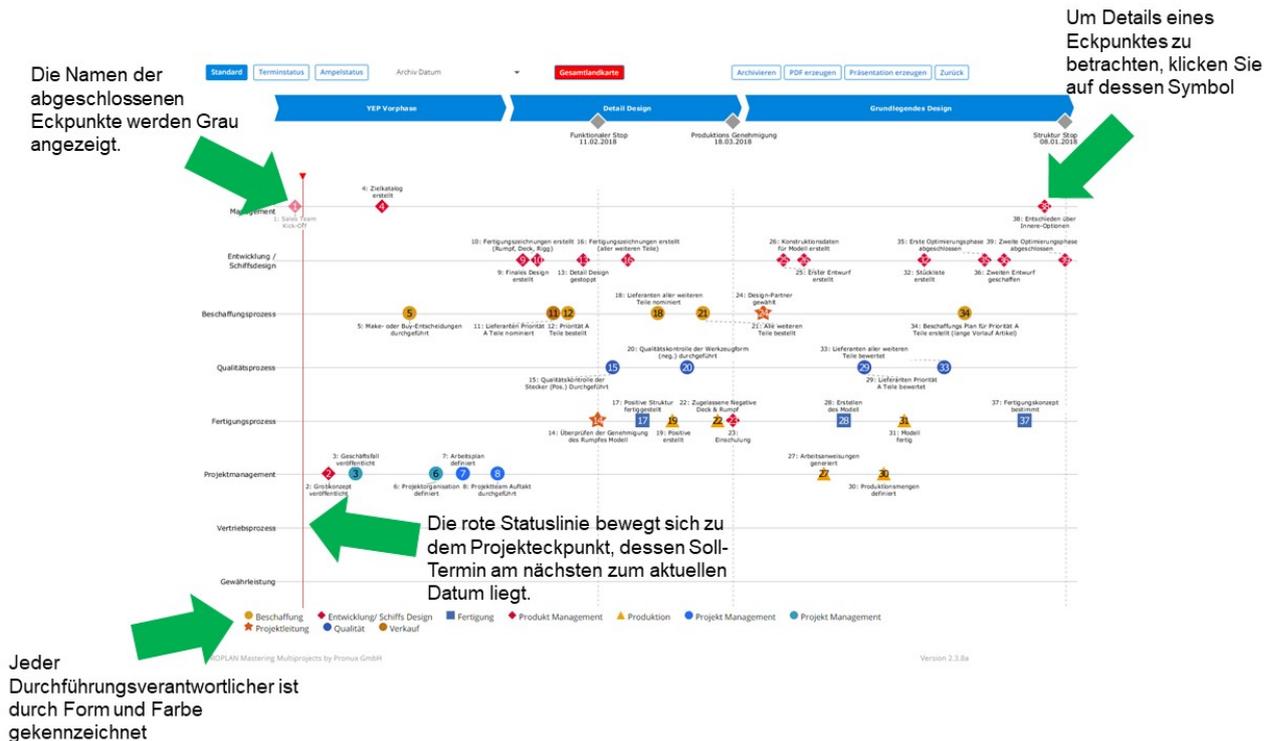

Zusätzliche Konfigurationen

Funktionen	Beschreibung
Anzeige des Solltermins	<ul style="list-style-type: none"> • Zur besseren Terminierung kann der Solltermin des entsprechenden Eckpunktes über eine Mouse Over Funktion angezeigt werden.
Zeitstrahl für Projektlandkarte	<ul style="list-style-type: none"> • Die Zeitstrahlsansicht ermöglicht eine gesonderte Darstellung der Projektlandkarte nach Monaten oder Kalenderwochen. • Der Benutzer kann sich die individuell relevanten Informationen im Prozessfortschritt oder auf den Projektzeitstrahl anzeigen lassen.
Filterung der Projektlandkarte	<ul style="list-style-type: none"> • In der Landkarte kann spezifisch nach Phasen, Teilprozesse, Rollen, Status gefiltert werden. • Die Darstellung der Meilensteine kann ein- oder ausgeblendet werden.

Phasen

Teilprozesse

Rollen

Status

Meilensteine anzeigen

- Netzkonzeption
- Projektmanagement
- Finanzierungs-/ Kostenmanagement
- Beschaffung/ Einkauf/ Vertrags management
- Technische Planung
- Kapazitäts management/ Baugistik
- Qualitäts-/ Risikomanagement
- Inbetriebnahme steuerung
- Baudurchführung

Projektmanagement

Finanzierungs-/
Kostenmanagement

Bitte auf eine Phase klicken, um die Landkarte zu vergrößern.



Landkraft 02.2020 3 Inbetriebnahme erfolgt (MS4 gem. BUV) 13.11.2027 4

Kommunikationskonzept für die Bauausführung festgelegt 5 Funktionsträger ernannt 6 Anlagen übergeben 7

Vorgezogene Leistungen inkl. Grundfinanzierung geprüft und gesichert zurückgeführt 8

GWP validiert 9 Mittelfreigabe erfolgt 10 Schlussrechnung und anerkannt 11

FinVe(n) abgeschlossen 12 Kostenfortschreibung über APV bestätigt (jährlich) 13

APV gezeichnet (Aufnahme der Maßnahme in SV Lph 3/4)

LBA (Bewertet, Einwendungen bearbeitet)

Planrecht
