

Jira Aufgabenplanung


Das strategische Multiprojektmanagementsystem PROPLAN wird um eine detaillierte Aufgabenplanung erweitert, um Doppelangaben zu minimieren und Parallelplanungen zu vermeiden.

Die Planung von Eckpunkten und Maßnahmen kann zeitsparender durchgeführt und überprüft werden, da gespeicherte Änderungen in beiden Systemen automatisch übernommen werden.

Multiprojektmanagement in PROPLAN und Aufgabenbearbeitung in Jira

Your browser does not support the HTML5 video element

PROPLAN Jira Mapping

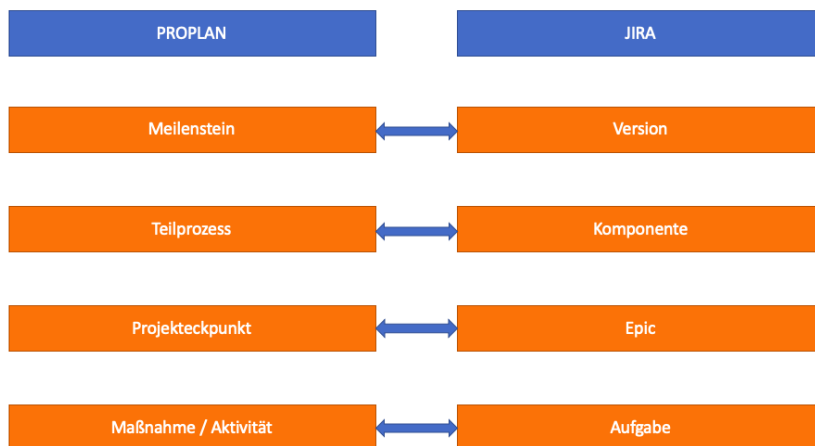

Konfiguration von Proplan und Jira

Your browser does not support the HTML5 video element

Synchronisation von Daten

Your browser does not support the HTML5 video element

Neues Projekt anlegen

In der Projektübersicht wird zunächst ein neues Projekt angelegt.

The screenshot shows the PROPLAN web application interface. At the top, there's a header with the PROPLAN logo, user information (Mustermann, Max), and navigation icons. Below the header, there's a sidebar with a 'Portfolio' section containing 'Projekte', 'ToDo Liste', 'Kritische Änderungen', and 'Multi Projekt Cockpit'. The main area displays a table of projects. The table has columns: Status, Projektleiter, Aktiv, Projekttyp, Projektphase, Projekt, Volumen, Projektstatus, Meilenstein, Projektleiter, and Bearbeiten. Two projects are listed: 'Motoryacht Elektro' and '006 Segelyacht (Masterbeispiel)'. The 'Motoryacht Elektro' project has a status of 'Funktionaler Stopp' and a milestone of '26.04.2019'. The '006 Segelyacht (Masterbeispiel)' project has a status of 'Produktions Genehmigung' and a milestone of '23.07.2020'. The 'Bearbeiten' column contains links for 'Checkliste', 'Summary', and 'Bearbeiten' for each project.

Im Bereich Projektdaten werden für das neue Projekt die Basisprojektdaten wie Projektname und Projekttyp sowie Meilensteintermin eingepflegt. Die Meilensteine werden als Versionen in Jira angezeigt und das Meilensteindatum entspricht in Jira dem Veröffentlichungsdatum.

PROPLAN Mustermann, Max | ? ⚙️ 🔌 | de en it fr

Motoryacht Elektro

Portfolio

- Projekte
- ToDo Liste
- Kritische Änderungen
- Multi Projekt Cockpit

Projekt

- Checkliste
- Bereich Projektdaten**
- Landkarte
- Projektpunkte
- Projektdaten
- Dokumentliste
- Projektaufwerk
- Aufgabenplanung

Jira Projekt anlegen

Nr. ①

Projektname* Motoryacht Elektro

Projektleiter Bitte wählen

Kunde

Volumen ② T EUR

Projekttyp* Standard

Masterprojekt Bitte wählen

Projektstatus

Land

Aktivitätsstatus Aktiv

MEILENSTEINE

Funktionaler Stopp 26.04.2019

Produktions Genehmigung 23.12.2019

Projekt Management 20.09.2019

Projektbild

+ Bitte wählen

Bild zuschneiden

Webcamlink http://

MEILENSTEINFREIGABE / EMAILVERTEILER

NAME	KOORDINATOR	ROTE AMPEL	INFO-MAIL
Bitte wählen	☐	☐	☐

HINZUFÜGEN

Wurden alle Meilensteintermine eingepflegt, kann man das ausgewählte Projekt in Jira anlegen. Um die Synchronisation mit Jira zu starten, muss zunächst ein Projektschlüssel für dieses Projekt eingetragen werden.

Der eingetragene Projektschlüssel entspricht dem Namen des Jira Boards für dieses Projekt. Bei der Vergabe des Projektschlüssels ist zu beachten, dass keine Zahlenwerte und keine Leerzeichen verwendet werden.

PROPLAN Mustermann, Max | ? ⚙️ 🔌 | de en it fr

Motoryacht Elektro

Portfolio

- Projekte
- ToDo Liste
- Kritische Änderungen
- Multi Projekt Cockpit

Projekt

- Checkliste
- Management Summary
- Gantt diagramm
- Landkarte
- Projektpunkte
- Bereich Projektdaten**
- Projektdaten
- Dokumentliste

Jira Projekt anlegen

PROJEKTDATEN BASIC

Nr. ①

Projektname* **Jira Projekt anlegen**

Projektleiter Projektschlüssel

Kunde

Volumen ②

Projekttyp* Standard

Masterprojekt Bitte wählen

Projektstatus

La

Aktivitätsstatus Aktiv

MEILENSTEINE

BILDUPLOAD

Projektbild ②

+ Bitte wählen

Bild zuschneiden

Webcamlink http://

...EILENSTEINFREIGABE / EMAILVERTEILER

NAME	KOORDINATOR	ROTE AMPEL	INFO-MAIL
Bitte wählen	☐	☐	☐

HINZUFÜGEN

Die Synchronisation, um die Projektdaten in Jira zu übernehmen, dauert circa eine Minute. Nach erfolgreicher Synchronisation erscheint eine Mitteilung, dass das Projekt erfolgreich in Jira angelegt wurde.

PROPLAN Mustermann, Max | de en it fr

Ihr Projekt wurde erfolgreich in Jira angelegt

Eckpunkte aktualisieren | Speichern | Abbrechen | Löschen

Projektname* Motoryacht Elektro

Projektleiter Bitte wählen

Kunde

Volumen

Projekttyp* Standard

Masterprojekt Bitte wählen

Projektstatus

Land

Aktivitätsstatus Aktiv

MEILENSTEINE

Funktionaler Stopp 26.04.2019

Projektbild

+ Bitte wählen

Bild zuschneiden

MEILENSTEINFREIGABE / EMAILVERTEILER

NAME	KOORDINATOR	ROTE INFO-AMPEL	MAIL
Bitte wählen			

HINZUFÜGEN

Im Bereich Aufgabenplanung wird man automatisch zu dem Jira Board des ausgewählten Projektes weitergeleitet. In Jira wurde automatisch ein Kanban-Board für dieses ausgewählte Projekt angelegt.

Meilensteine entsprechen in Jira der Version, Projekteckpunkte entsprechen in Jira dem Epic und Maßnahmen entsprechen in Jira den Aufgaben.

PROPLAN Startseite | Projekte | Vorgänge | Boards | Portfolio | BigPicture | Erstellen

ME board

Version entspricht Meilenstein | **Epic entspricht Projekteckpunkt** | **Maßnahmen entsprechen Aufgaben**

aktualisiert

ME Sprint 1

Sprint starten

ME-5 Analyse externer Marktdaten

Funktionaler Stopp

Marktanalyse durc...

+ Vorgang erstellen

1 Schätzung 0

Backlog 4

Sprint erstellen

ME-6 Analyse interner Marktdaten

Funktionaler Stopp

Marktanalyse durc...

ME-7 Besprechungsvorbereitung

Funktionaler Stopp

Marktanalyse durc...

ME-8 Präsentation der Marktdatenanalyse

Funktionaler Stopp

Marktanalyse durc...

ME-9 Strategiemeeting terminieren

Funktionaler Stopp

Marktanalyse durc...

Synchronisation nach Jira: Eckpunkte/Massnahmen pflegen

In der Checkliste in Proplan können in den Projekteckpunkten Soll-Termine eingepflegt und Maßnahmen mit entsprechenden Terminen angelegt werden. Über den Bereich Aufgabenplanung wird das Kanban-Board in Jira geöffnet.

Ein eingetragener Soll-Termin im Projekteckpunkt wird im entsprechenden Epic angezeigt. Die eingetragenen Maßnahmen werden in Jira als Aufgaben aufgelistet.

PROPLAN Mustermann, Max

Archiv Datum

Eckpunkte Durchführungsver. Teilprozess Phase Status (no filter)

Filter zurücksetzen

Excel Export Archivieren Einblenden PDF erzeugen Abbrechen Speichern

Maßnahme anlegen

1 Marktanalyse durchgeführt 2

Maßnahmen (3 von 6 nicht erledigt) Aktivitäten (2 von 2 nicht erledigt) Informationen (0)

alle Erledigte ausblenden alle einblenden

NR.	BESCHREIBUNG	TYP	VERANTWÖRTLICHER	TERMIN	ERLEDIGT	AUSBLENDEN	LÖSCHEN
2	Analyse von Marktdaten	Aktivitäten	Bitte wählen	18.03.2019		-	
3	Besprechungsvorbereitung	Aktivitäten	Bitte wählen	21.03.2019		-	
4	Präsentation der Marktdatenanalyse	Aktivitäten	Bitte wählen	27.03.2019		-	
5	Strategie meeting terminieren	Aktivitäten	Bitte wählen	29.03.2019		-	

2 Grobkonzept veröffentlicht

Basisschiff-Konzept diskutiert und festgelegt

Grundidee ist es, mindestens 5 von 10 Team-Mitglieder, vom dem definierten Schiff-Konzept zu überzeugen

1 Discuss and define basic ship concept with SE-team and highlight risks

Über den Bereich Aufgabenplanung wird das Kanban-Board in Jira geöffnet. Die eingetragenen Soll-Termine werden im Epic abgeändert und neue Maßnahmen angelegt.

Synchronisation nach PROPLAN: Eckpunkte/Massnahmen pflegen

Wird in Jira das Fälligkeitsdatum eines Epics abgeändert, wird in Proplan der Soll-Termin des entsprechenden Projekteckpunkt automatisch abgeändert.

PROPLAN Startseite Projekte Vorgänge Boards Portfolio BigPicture Erstellen Suche

Motoryacht Elektro / ME-1

Marktanalyse durchgeführt 2

Bearbeiten Kommentar Zuweisen Weitere Aktionen Aufgaben Wird Ausgeführt Fertig Admin Exportieren

Details

Typ: Projekteckpunkt

Priorität: Medium

betrifft Version(en): Keine

Stichwörter: Keine

Epic Name: Marktanalyse durchgeführt 2

Beschreibung

Klicken um die Beschreibung hinzuzufügen

Anhänge

Dateien zum Anhängen ablegen oder durchsuchen.

Aufgaben (Arbeitsablauf anzeigen)

Status: Nicht erledigt

Lösung: Keine

Lösungsversion(en): Keine

Personen

Bearbeiter: proplan

Mir zuweisen

Pronux Admin

Stimmen: Beobachter verwalten

Beobachten beenden

Daten

Erstellt: 29/Mär/19

Aktualisiert: Vor 2 Tagen Jetzt

Änderung des Fälligkeitsdatums im Jira

Soll Termin wird im Projekteckpunkt abgeändert

PROPLAN

Archiv Datum

Eckpunkte Durchführungsver. Teilprozess Phase Status (no filter)

Filter zurücksetzen

Excel Export Archivieren Einblenden PDF erzeugen Abbrechen Speichern

1 Marktanalyse durchgeführt 2

Maßnahmen (3 von 6 nicht erledigt) Aktivitäten (2 von 2 nicht erledigt) Informationen (0)

alle Erledigte ausblenden alle einblenden

NR.	NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIEN	BESCHREIBUNG	START TERMIN	SOLL TERMIN	IST TERMIN	STATUS
1	Marktanalyse durchgeführt 2	Analyse externer und interner Marktdaten, Kundensegmente kompimentieren.		29.03.2019		

Wird in Jira das Fälligkeitsdatum einer Aufgabe abgeändert, wird in Proplan der Termin der entsprechenden Maßnahme automatisch abgeändert.

PROPLAN Startseite Projekte Vorgänge Boards Portfolio BigPicture Erstellen Suche

Motoryacht Elektro / ME-6

Analyse interner Marktdaten

Bearbeiten Kommentar Zuweisen Weitere Aktionen Aufgaben Wird Ausgeführt Fertig Admin Exportieren

Details

Type: ☒ Aufgabe
 Priorität: **Medium**
 betrifft Version(en): Keine
 Stichwörter: Keine
 Epic Link: **Marktanalyse durchgeführt 2**

Status: **FERTIG** (Arbeitsablauf anzeigen)
 Lösung: **Fertig**
 Lösungsversion(en): **Funktionaler Stopp**

Personen

Bearbeiter: **proplan**
 Mir zuweisen
 Autor: **Pronux Admin**
 Stimmen: **0**
 Beobachter verwalten: **1 Beobachten beenden**

Daten

Fällig: **18/Mär/19**
 Erstellt: Vor 2 Tagen
 Aktualisiert: Jetzt
 Erledigt: Jetzt

Beschreibung

Klicken um die Beschreibung hinzuzufügen

Anhänge

Dateien zum Anhängen ablegen oder durchsuchen.

Änderung des
Fälligkeitsdatums der
Aufgabe in Jira

PROPLAN

Mustermann, Max

Archiv Datum

Eckpunkte Durchführungsvor Teilprozess Phase Status (no filter)

Excel Export Archivieren Einlaggen PDF erzeugen Abbrechen Speichern

NR. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIEN	BESCHREIBUNG	START TERMIN	SOLL TERMIN	IST TERMIN	STATUS
1 Marktanalyse durchgeführt 2	Analyse externer und interner Marktdaten. Kundensegmente komplementieren.				

Termin der Maßnahme wird in der Checkliste abgeändert

Massnahmen (0 von 0 nicht erledigt) Aktivitäten (2 von 2 nicht erledigt) Informationen (0)

NR.	BESCHREIBUNG	TYP	VERANTWÖRTLICHER	TERMIN	ERLEDIGT	AUSBLENDEN	LÖSCHEN
2	Analyse von Marktdaten	Aktivitäten	Bitte wählen	18.03.2019			

In der Basiskonfiguration werden nur Maßnahmen und Aktivitäten synchronisiert, jedoch keine Aufgaben die in Jira zusätzlich bei einer Epic hinterlegt sind
